

— Geveloplossingen

Buitenspouwblad metselwerk

Checklist Wkb



Opdrachtgever:

Datum:

Projectnummer:

Projectomschrijving:

Adres:

Vorbereidingsfase

Zijn de constructieve gegevens van de buitengevels beoordeeld door de hoofdconstructeur en toegevoegd aan het projectdossier?

JA

NEE **Actie ondernemen** - Constructieve gegevens met akkoord hoofdconstructeur aan het projectdossier toevoegen.

Productcertificaten van de binnenspouwblad-elementen en de toegepaste spouwmuurisolatie aan het projectdossier toevoegen.

Worden de juiste bakstenen toegepast (sortering, formaat) en komt de orderbon overeen met de keuze en opdrachtbevestiging?

JA Maak foto's orderbon en leg dit vast in het projectdossier.

NEE **Actie ondernemen** - Afstemmen met bouwmaterialenhandelaar/Wienerberger, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.

Is de maatvoering van het toe te passen product afgestemd op de maatvoering van de gevels (denk aan lagen- en koppenmaat) alsmede het metselwerkverband?

JA Leg lagen- en koppenmaat en het verband vast.

NEE **Actie ondernemen** - vastleggen van product specifieke informatie middels technische documentatie. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.

NVT Reden noteren.

Wordt de juiste metsel- dun- of lijm mortel gekozen bij de toe te passen baksteen?

JA Leg type metsel- dun- of lijm mortel vast in het projectdossier.

NEE **Actie ondernemen** - Afstemmen met mortelproducent, Wienerberger, en metselaar. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.

Is er een dilatatieadvies gemaakt?

- JA** Neem dilatatieadvies op in projectdossier.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met fabrikant, constructeur, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.
- NVT** Reden noteren.

Is er een spouwankeradvies gemaakt?

- JA** Neem spouwankeradvies op in projectdossier.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met fabrikant, constructeur, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.
- NVT** Reden noteren.

Is de verwerker bekend met het algemene of specifieke verwerkingsadvies van de baksteen?

- JA**
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met aannemer en metselaar/verwerker, download op website Wienerberger.

Uitvoeringsfase

Worden de juiste bakstenen toegepast (sortering, formaat en kleur) en komt de vrachtbrief overeen met de order?

- JA** Maak foto's vrachtbrief en de sticker op het steenpakket en leg dit vast in het projectdossier.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met bouwmaterialenhandelaar/Wienerberger, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.

Wordt het werk uitgevoerd volgens het morteladvies van de mortelproducent en kloppen de uitvoeringsomstandigheden?

- JA** Leg type metsel- dun- of lijm mortel vast in projectdossier.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met bouwmaterialenhandelaar/Wienerberger, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.
- NVT** Reden noteren.

Is de constructieve uitvoering van de buitengevel volgens berekening/tekening?

- JA** Maak (overzicht)foto's van de gevelconstructie.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen constructeur. Maatregelen vastleggen in projectdossier. Foto's maken.

Worden de metselwerkdilataties volgens het dilatatieadvies correct uitgevoerd? Is de dilatatie tussen 5 en 10 mm (gebruik geen glijankers tenzij voorgeschreven door de constructeur)?

- JA** Neem dilatatieadvies op in projectdossier. Foto's maken van verticale en eventuele horizontale dilataties.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen constructeur. Maatregelen vastleggen in projectdossier. Foto's maken.

Worden de spouwankers volgens het spouwankeradvies en correct aangebracht?

- JA** Foto's maken.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met fabrikant, constructeur, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.

Worden de spouwankers volgens het spouwankeradvies en correct aangebracht?

- JA** Foto's maken.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met fabrikant, constructeur, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.

Is de ondergrond voor het buitenspouwblad vlak?

- JA** Foto's maken.
- NEE** **Actie ondernemen** - Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier. Foto's maken.
- NVT** Reden noteren.

Is een proefmuur op de bouwlocatie aanwezig, uitgevoerd in metselverband en maatvoering volgens tekeningen?

- JA** Foto's maken.
- NEE** **Actie ondernemen** - Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier. Foto's maken.
- NVT** Reden noteren.

Worden folies en afwateringsslabben t.p.v. gevelopeningen (deur-en raamkozijnen) op correcte wijze aangebracht?

- JA** Foto's maken.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met aannemer, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.
- NVT** Reden noteren.

Zijn de aansluitingen van het buitenspouwblad ter plaatse van opgaand werk waterkerend uitgevoerd?

- JA** Foto's maken.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met aannemer, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.
- NVT** Reden noteren.

Maken speciebaarden contact met de isolatie?

- JA** **Actie ondernemen** - Afstemmen met fabrikant, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier. Maak foto's.
- NEE** Maak foto's.

Worden de bakstenen van Wienerberger toegepast (sortering, formaat en kleur) en komt de orderbon (in de basis) overeen met het advies?

- JA** Maak foto's. (minimaal van de CE-markering van elke toe te passen metselbaksteensortering)
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met Wienerberger, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.
- NVT** Reden noteren.

Is een proefmuur op de bouwlocatie aanwezig, uitgevoerd in metselverband volgens tekeningen?

- JA** Foto van de proefmuur.
- NEE** **Actie ondernemen** - Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier. Foto's maken.
- NVT** Reden noteren.

Bij doorstrijken: wordt de voegafwerking uitgevoerd overeenkomstig de gemaakte afspraken?

- JA** Foto's maken.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met aannemer, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.
- NVT**

Bij traditioneel metselen en voegen, wordt de voegkleur en voegtype en afwerking uitgevoerd overeenkomstig de gemaakte afspraken?

- JA** Foto's maken.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met aannemer, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.

Is voldoende afwatering in het buitenspouwblad voorzien, d.m.v. open stootvoegen?

- JA** Foto's maken.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met aannemer, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.
- NVT** Reden noteren.

Worden stalen lateien d.m.v. glijfolie opgelegd?


- JA** Foto's maken.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met aannemer, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.
- NVT** Reden noteren.

Zijn de geveldrager en/ of metselwerkondersteuning(en) aangebracht overeenkomstig de voorschriften van de geveldragerleverancier?

- JA** Foto's maken.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met fabrikant, aannemer en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.
- NVT** Reden noteren.

Voldoet het buitenspouwblad aan eisen van regelmatigheid van het metselverband en vlakheid van de buitengevel?

- JA** Foto's maken.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met fabrikant, aannemer en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.
- NVT**

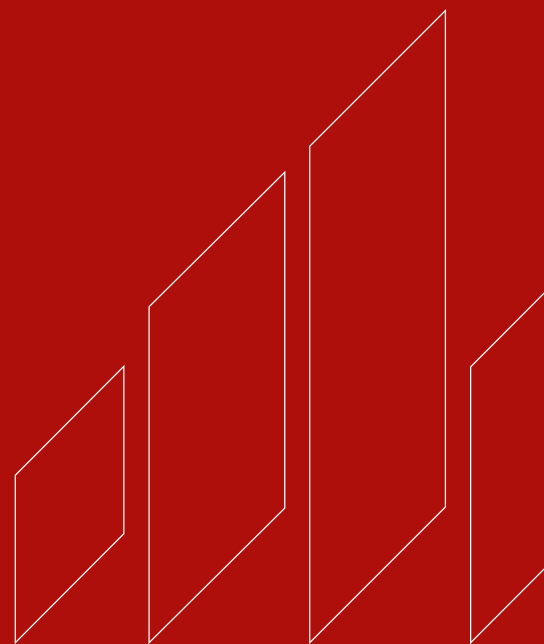

Wienerberger B.V.
088 - 118 51 00
info.nl@wienerberger.com
wienerberger.nl

